

**大熊町特定帰還居住区域の
解体除染事業の進捗状況について**

令和7年10月6日

環境省福島地方環境事務所

1. 特定帰還居住区域における解体・除染事業の 進捗状況について


- 特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その１）
 - 解体：１１件、除染：１１ha
 - 工期：令和５年１１月から令和６年１２月（竣工）
 - 受注者：大成・日本国土特定建設工事共同企業体
- 特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その２）
 - 解体：１３８件、除染：３５ha（特定復興再生拠点区域を含む。）
 - 工期：令和６年７月から令和７年７月（竣工）
 - 受注者：前田・熊谷・佐藤特定建設工事共同企業体
- 特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その３）
 - 解体：１１１件、除染：１３０ha（特定復興再生拠点区域を含む。）
 - 工期：令和７年５月から令和８年３月
 - 受注者：前田・熊谷・佐藤特定建設工事共同企業体

- 除染の同意取得状況（令和7年8月末時点）
 - 対象関係人：1, 155名（うち下野上1区：59名、野上2区：36名）
 - 同意済：559名（うち下野上1区：45名、野上2区：29名）
- 除染の進捗状況（令和7年8月末時点）
 - 下野上1区：約62ha中、約47ha完了（約76%）
 - 野上2区：約45ha中、約35ha完了（約78%）
 - その他の行政区：町のインフラ復旧等工事箇所を中心に除染を実施中
約61ha完了、約15ha着手中

※数値は精査中であり、変更の可能性があります。
- 解体の進捗状況（令和7年8月末時点）
 - 解体申請数：226件（うち下野上1区：23件、野上2区：0件）
 - 解体完了：27件（うち下野上1区：13件、野上2区：0件）

先行地区における除染前後の空間線量率①（全体）

7

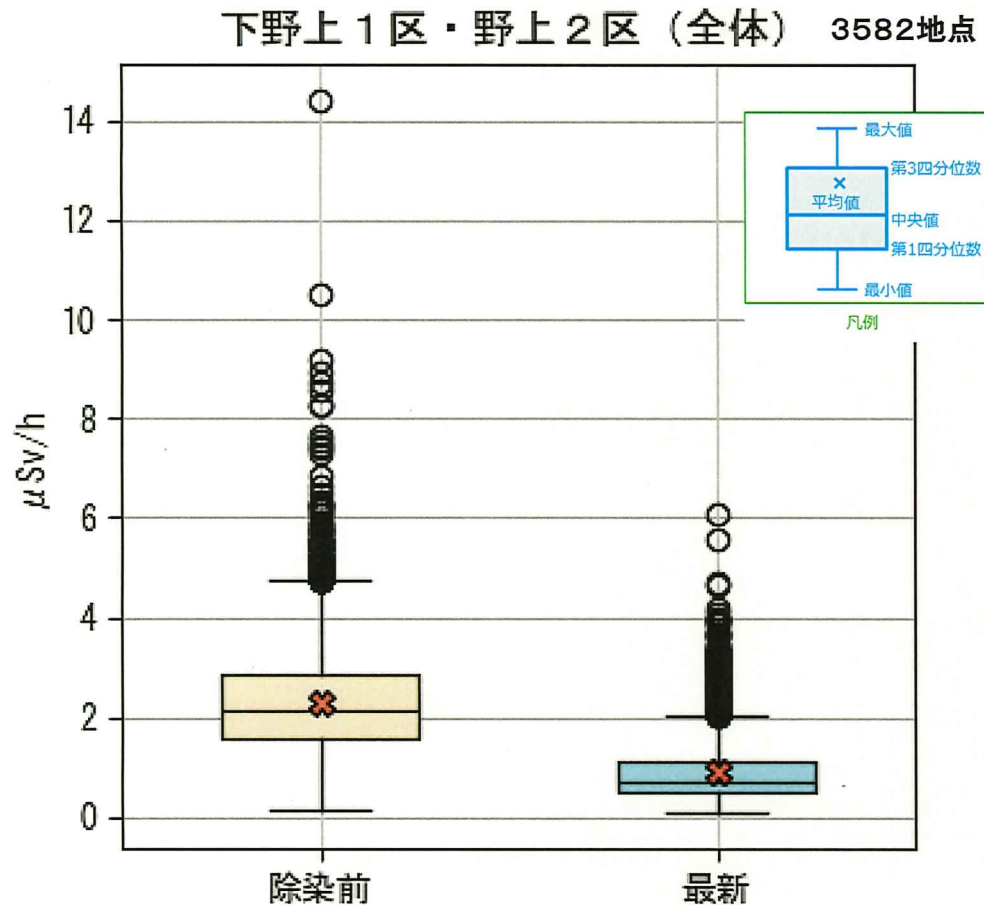


除染前のモニタリング結果

- － 期間：平成25年9月25日～令和7年6月13日
- － 測定数：3,582点
- － 最小値：0.14、第1四分位数：1.59、中央値：2.13、第3四分位数：2.85、最大値：14.4、 平均値：2.29 (μSv/h)



最新のモニタリング結果

- － 期間：令和元年5月28日～令和7年7月31日
- － 測定数：3,582地点
- － 最小値：0.10、第1四分位数：0.49、中央値：0.72、第3四分位数：1.11、最大値：6.05、 平均値：0.90 (μSv/h)
- － 3.8μSv/h超の地点(11地点)については、詳細モニタリングを行い、対策を実施する予定


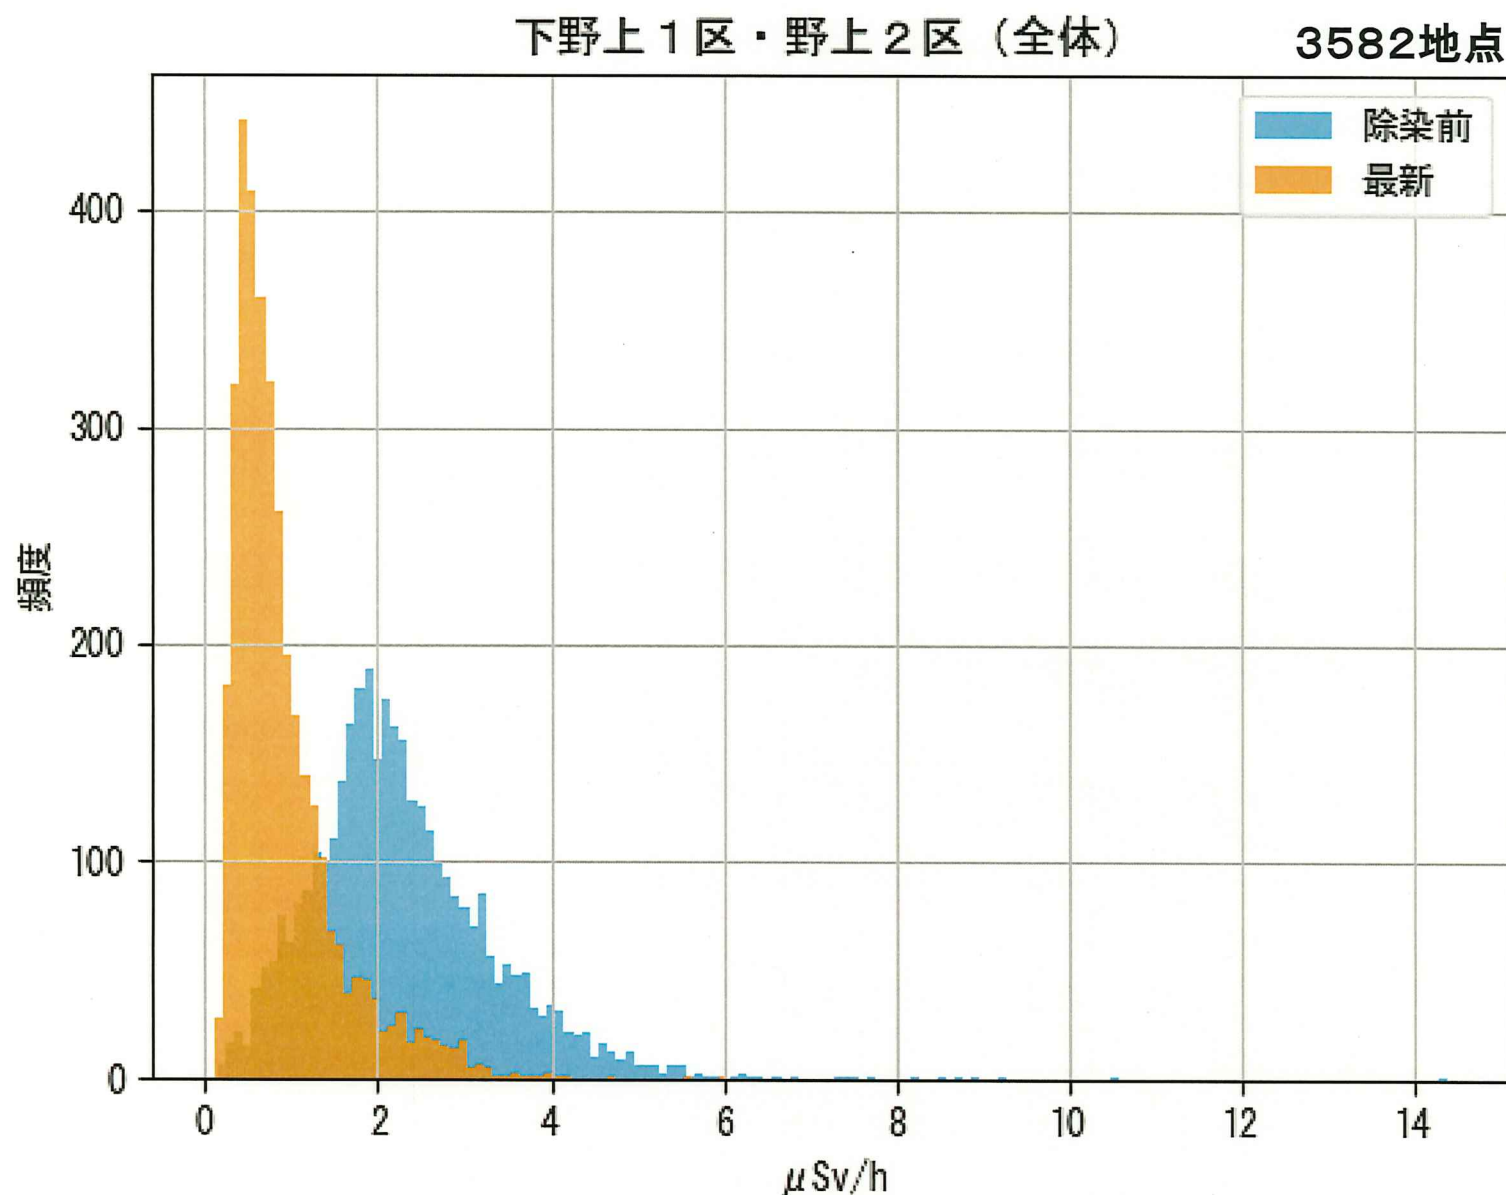


先行地区における除染前後の空間線量率③（宅地）



9

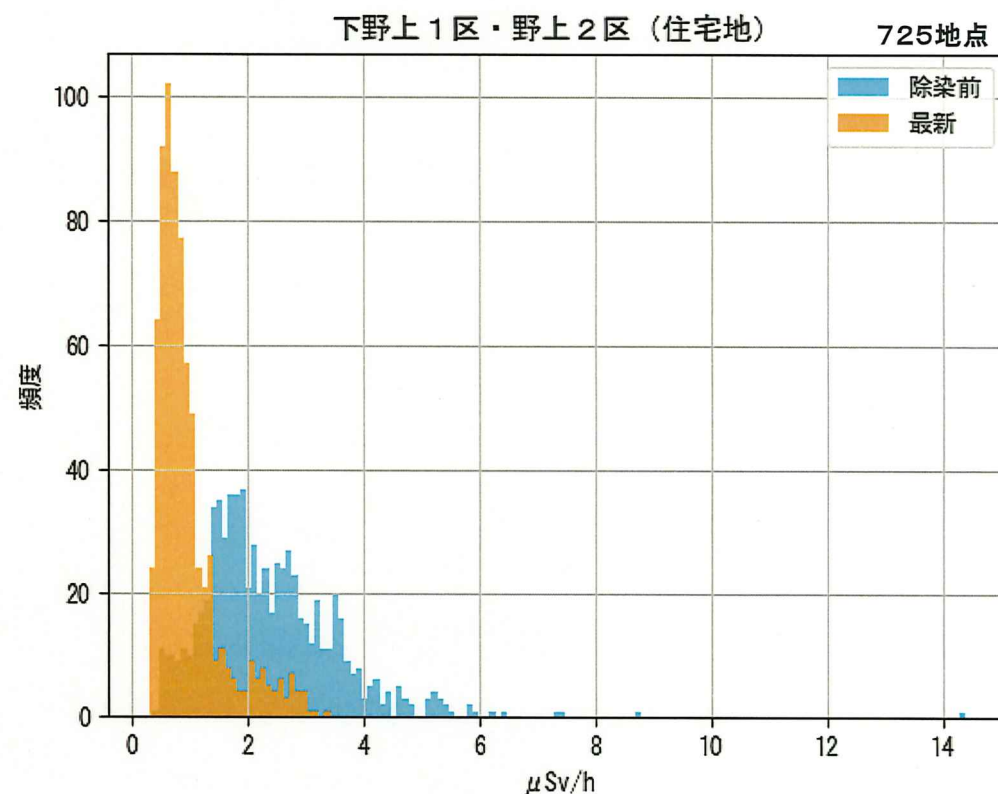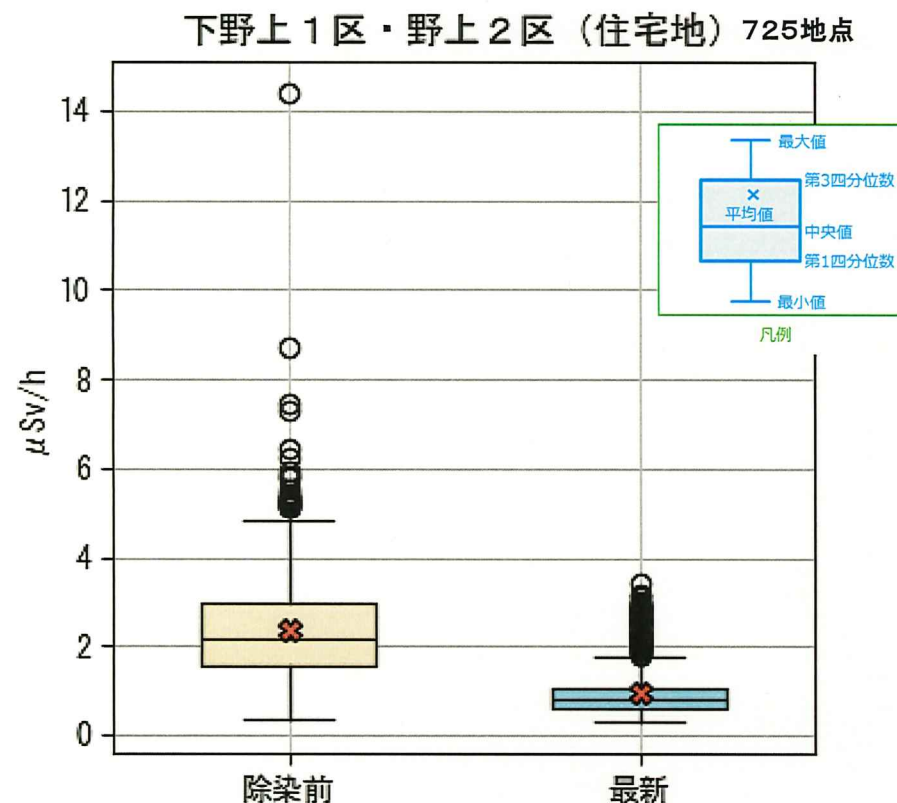



- ・除染前(μSv/h) 測定期間:平成29年11月14日～令和7年5月9日
最小値:0.36、第1四分位数:1.56、中央値:2.15、第3四分位数:2.95、最大値:14.4、平均値:2.37
- ・除染後(μSv/h) 測定期間:令和4年3月15日～令和7年6月17日
最小値:0.30、第1四分位数:0.61、中央値:0.80、第3四分位数:1.08、最大値:3.43、平均値:0.96

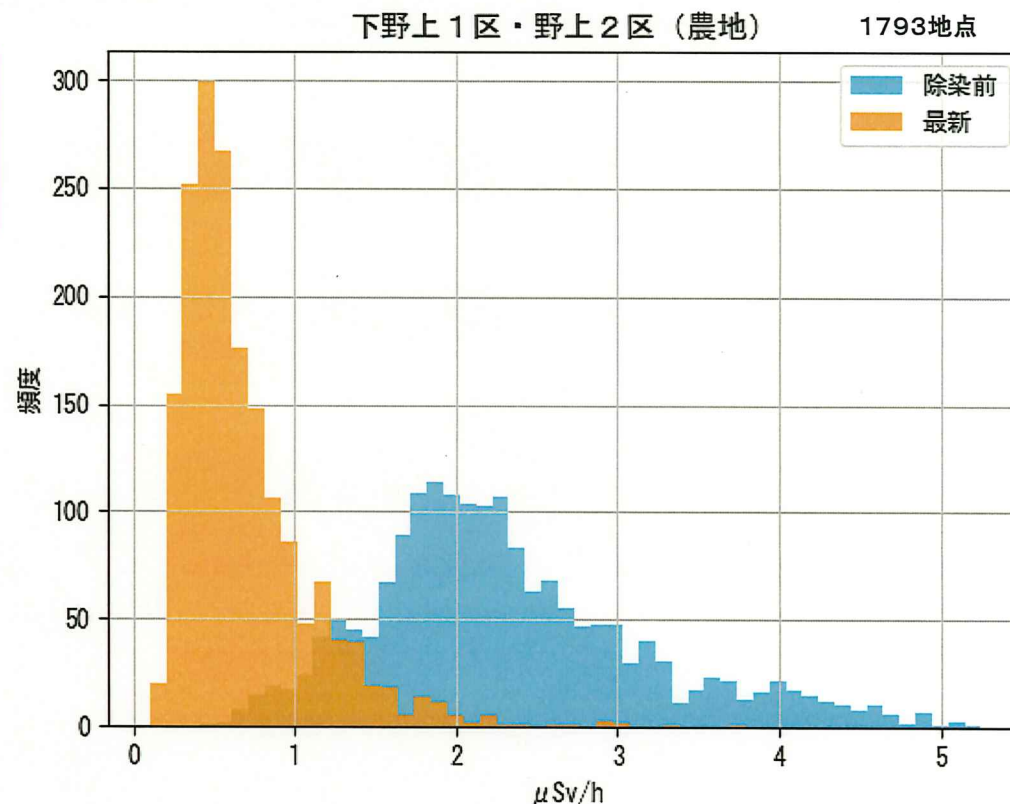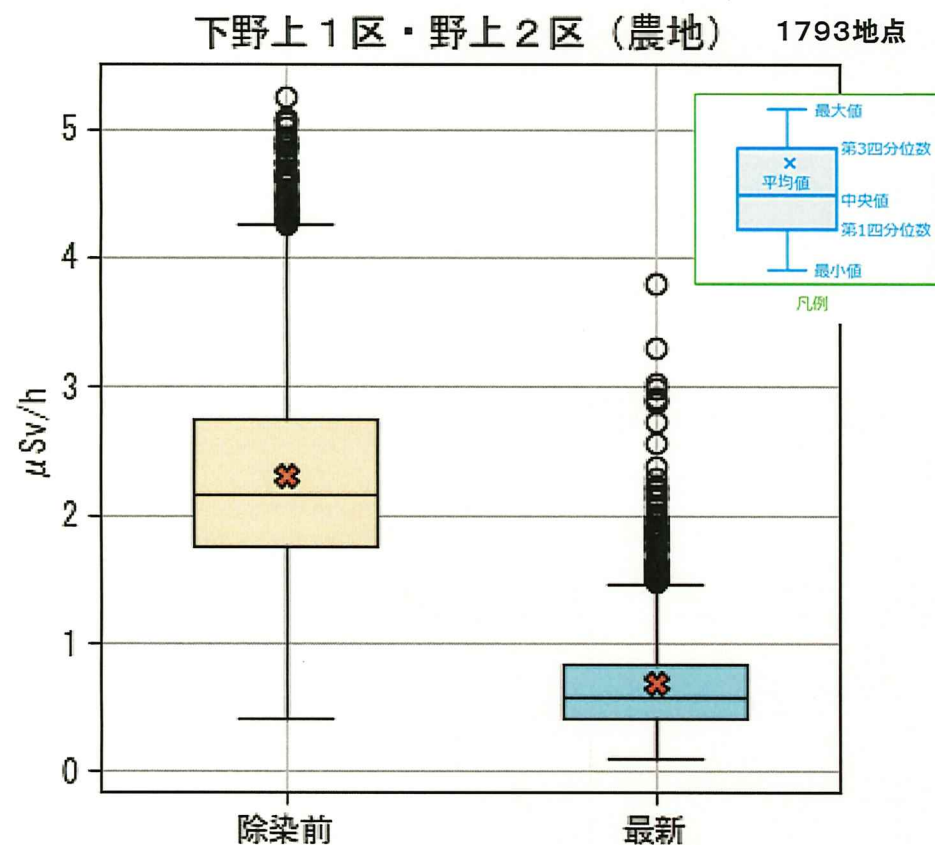

- ・除染前(μSv/h) 測定期間: 令和3年2月18日～令和7年6月13日
最小値: 0.41、第1四分位数: 1.75、中央値: 2.16、第3四分位数: 2.75、最大値: 5.25、平均値: 2.31
- ・除染後(μSv/h) 測定期間: 令和3年6月1日～令和7年7月31日
最小値: 0.10、第1四分位数: 0.41、中央値: 0.57、第3四分位数: 0.83、最大値: 3.79、平均値: 0.68

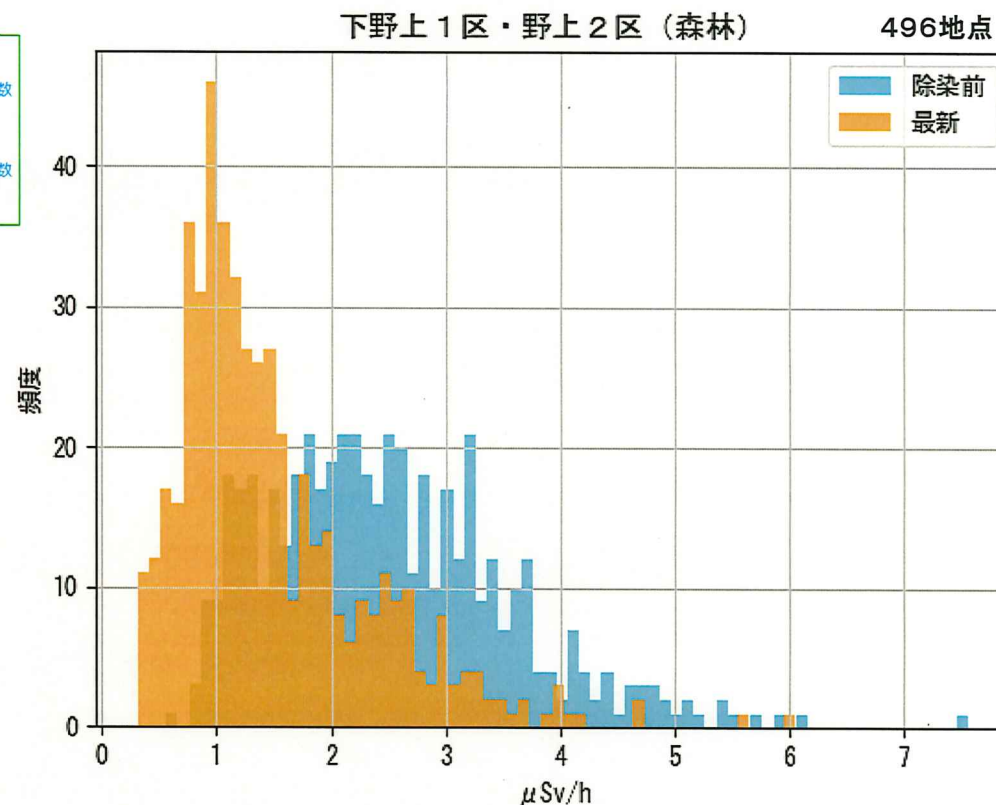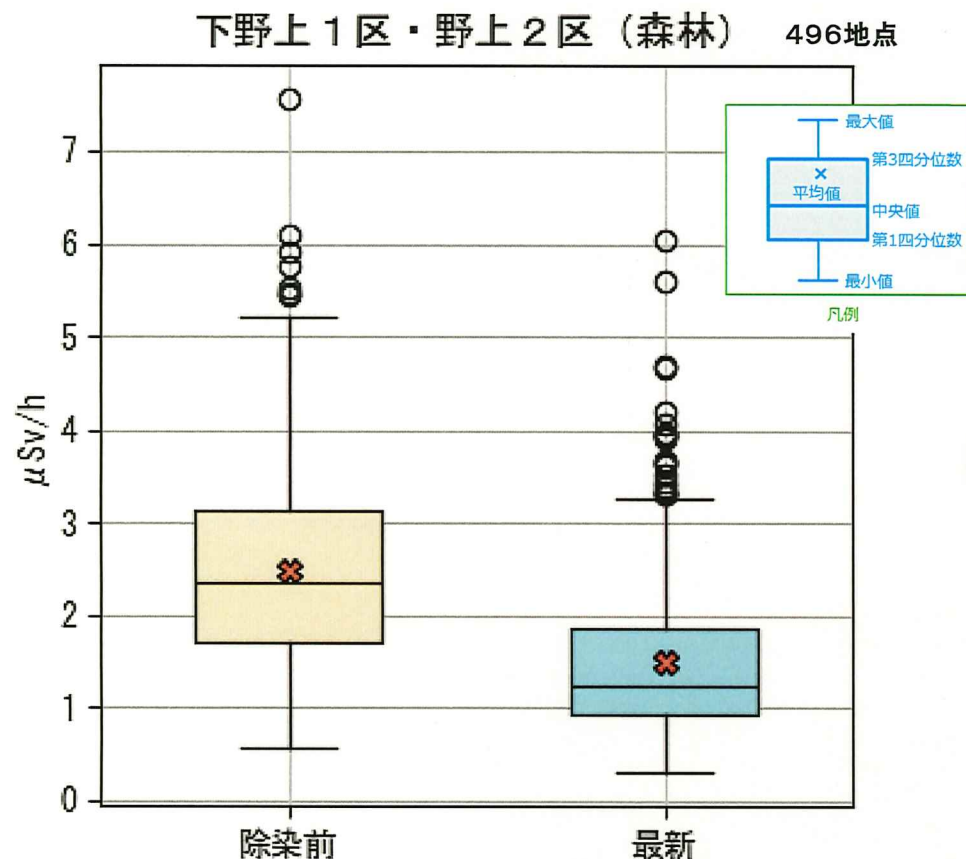

- 除染前(μSv/h) 測定期間: 令和3年3月4日～令和7年5月9日
最小値: 0.56、第1四分位数: 1.72、中央値: 2.36、第3四分位数: 3.13、最大値: 7.57、平均値: 2.49
- 除染後(μSv/h) 測定期間: 令和4年1月17日～令和7年6月18日
最小値: 0.31、第1四分位数: 0.92、中央値: 1.24、第3四分位数: 1.87、最大値: 6.05、平均値: 1.49

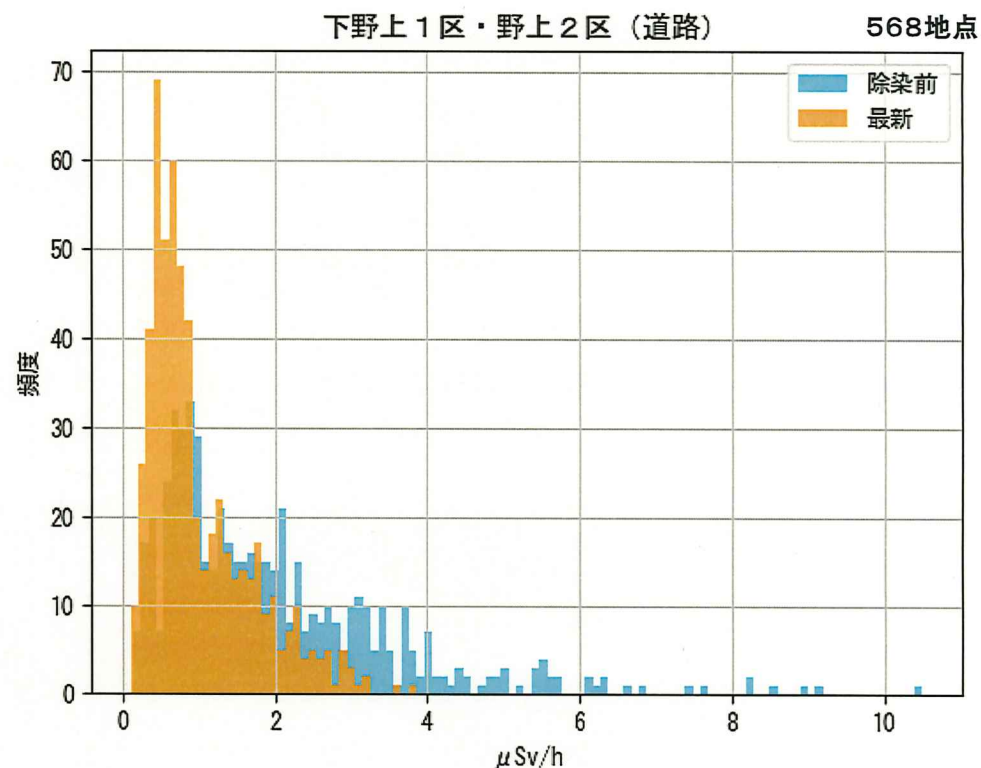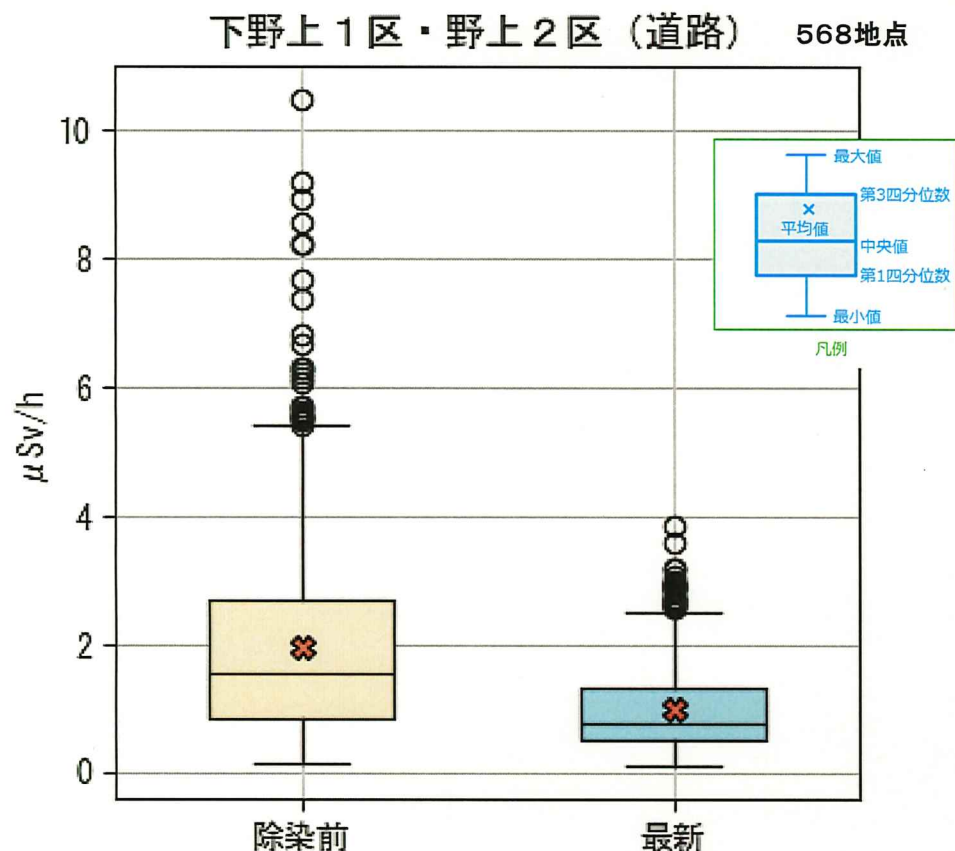

- 除染前($\mu\text{Sv/h}$) 測定期間:平成25年9月25日～令和7年6月12日
最小値:0.14、第1四分位数:0.87、中央値:1.57、第3四分位数:2.70、最大値:10.5、平均値:1.97
- 除染後($\mu\text{Sv/h}$) 測定期間:令和元年5月28日～令和7年7月31日
最小値:0.11、第1四分位数:0.51、中央値:0.78、第3四分位数:1.34、最大値:3.86、平均値:1.01

- 北向地区の側溝についてフォローアップ除染を実施（別添資料①参照）
 - 1 mで $3.8\mu\text{Sv/h}$ は下回るものの、側溝自体の汚染が残っている状況。
 - 更なる対策を実施するには側溝の撤去再設置が必要となる。
 - 町の側溝工事にあわせて対応することを検討中。
- 熊町地区農業集落排水施設近辺の農道法面（別添資料②参照）
 - 法面の削り取り、土のう設置による復旧を実施。
